Conduites CAD Industrie - Mayennets

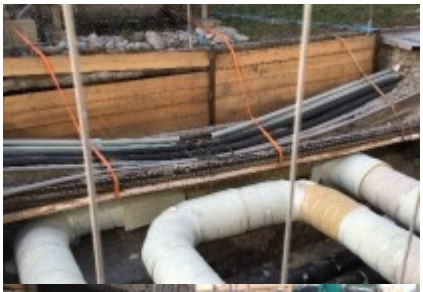

Désignation

Conduites CAD Industrie - Mayennets

Lieu

Sion

Description des travaux

Conduites de chauffage à distance CAD dans la rue de l'Industrie, la Cour de Gare, l'Avenue des Mayennets, y compris renouvellement des autres conduites et canalisations :
- Fouilles : 6'260.00 m^3
- Blindage : 7'200.00 m^2
- Conduites isolées DN 80 à 300 : 2'800.00 m'
- Remblayage : 5'325.00 m^3
- Béton : 52.00 m^3
- Pousse-tube : 76.00 m'
- Grave NT : 3'615.00 m^3
- Sable lavé : 2'400.00 m^3
- Enrobés : 960.00 to
